


730-1
730-2




730-6

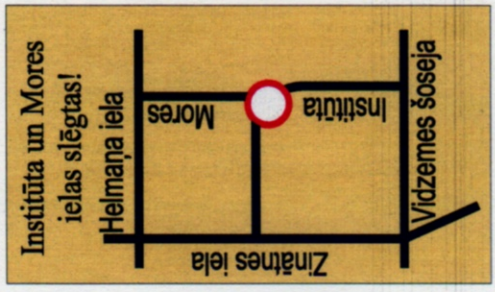

730-3



730-4
730-5

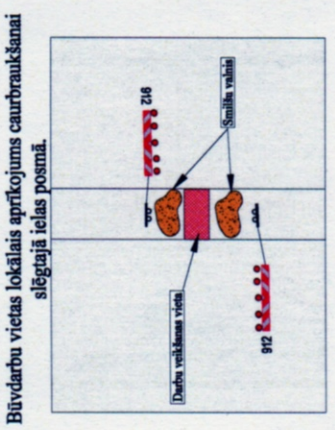

Būvdarbu vietas lokālais aprīkojums caurbraukšanai slēgtajā ielas posmā.

SASKAŅOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻU
Rīgas nodaļas ceļu būvzinātnis
V. REMESOVS

[Handwritten signature]

Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.i. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darbu vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77 "Ceļa zīmes" prasībām.
Esotās ceļa zīmes nav paredzētas demontēt/izņemt.
Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laukus fiksēt būvdarbu žurnālā.
Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma.
Ceļa zīmes Nr. 118+814/816 + 302+814/816 uzstādīt vismaz 20-25m pirms krustojuma, nodrošinot savstarpējo attālumu līdz esošajam ceļa zīmei 25m.
Ceļa zīmēm jābūt identiska izmēra grupas un gaisma atstarojas virsmas klases ar esošajām, uz ceļa uzstādītajām pastāvīgajām ceļa zīmēm.
Veicamo darbu veids: asfalta pētēšana, reciklēšana, asfalta ieklāšana.

- Būvdarbu zona
- Apraucomo ceļu maršruts

OBJEKTS	Mores ielas pārbūve Siguldā Instiitūta ielas pārbūve Siguldā
BOVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	10.04.2019.-08.05.2019.
BOVUZŅĒMĒIS	SIA "GP Holding" Reģ. Nr. 40103638943 Saulkrasti, Vaidavas iels 8, LV - 2160
ATBILDIGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Vīlms Paideris, t. 29340066
RASEJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus Mores un Instiitūta ielās, Siguldā. Shēma Nr. 1.
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service"
