





Piezīmes:


1. Būvdarbu vietas aprikojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
2. Aprikojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem” prasībām.
3. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 “Ceļa zīmes” prasībām.
4. Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izveļējiem.
5. Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un palīgbarjerām. Pārrokot gājēju ietves, nodrošināt gājēju tiltiņu ne mazāk kā 1,5m platu.
6. Esošas ceļa zīmes nav paredzēts demontēt / aizklāt.
7. Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
8. Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma. Ceļa zīmes nr. 118+814/815/816 uzstādīt 20-25 m pirms krustojuma.
9. Pirms nobrauktuvju uz īpašumiem pārrakšanas, savlaicīgi informēt iedzīvotājus par gaidāmajiem ierobežojumiem.
10. Ielas slēgšanai vispārīgai kustībai ir paredzēta tikai asfaltēšanas darbu laikā pārējiem darbiem pielietot shēmu Lokālā B un C
11. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt satiksmes regulētājus.

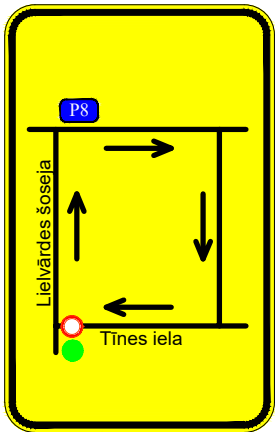


730-1

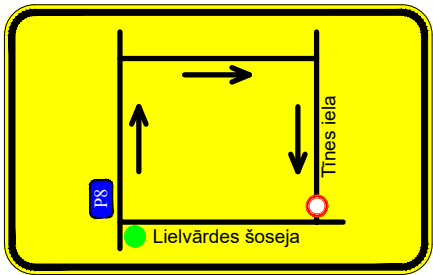

730-2

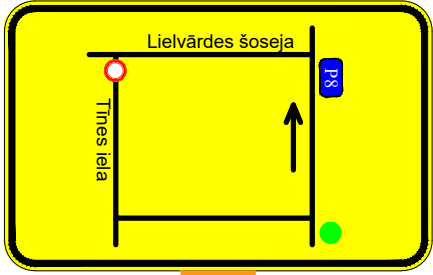

730-3

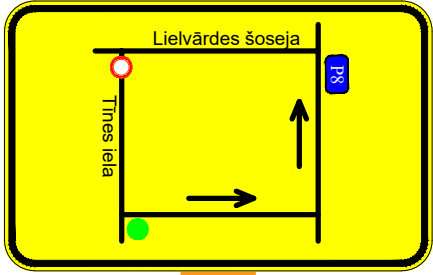


730-4

118 Uzstādāmās ceļa zīmes

Remonta zona


Apbraucamais ceļš

201 Esošās zīmes

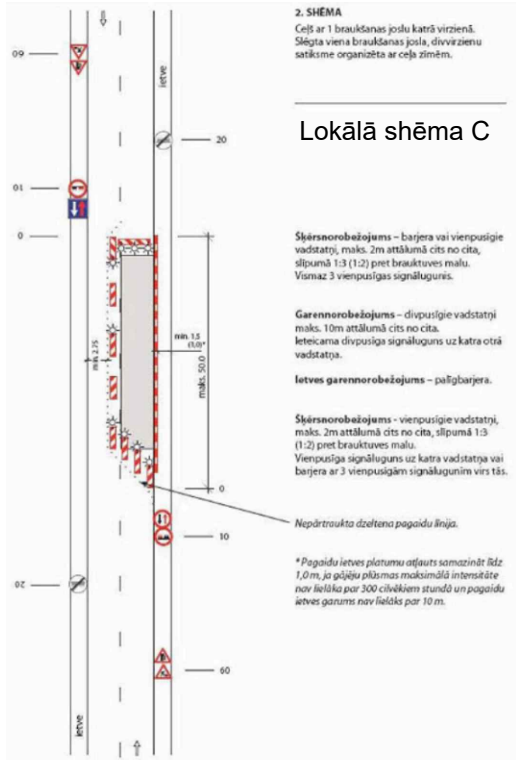

Lokālā shēma C

Pielietot lokālo darbu veikšanai: apauguma noņemšana, nomaļu uzpildīšana u.c.

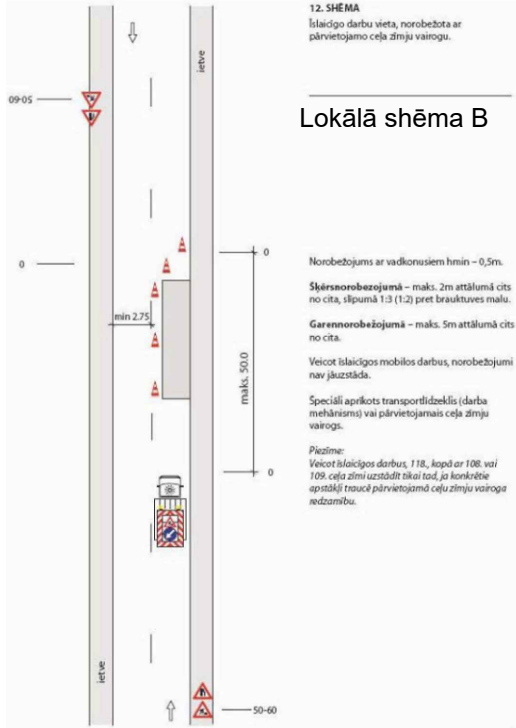

Lokālā shēma B

Pielietot lokālo darbu veikšanai: apauguma noņemšana, nomaļu uzpildīšana u.c.

OBJEKTS	Tīnes ielas, Upmalās, seguma atjaunošana Mālpils pagastā, Siguldas novadā.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	
BŪVUZŅĒMĒJS	SIA "Lastrada", reģ nr. 40103727211, adrese: Kurzemes prospekts 6-95, Rīga, LV1067
ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS	Mārtiņš Mednis, tālr. 28343085
RASĒJUMS	Satiksmes organizācijas shēma NR.1
IZSTRĀDĀJA	SIA “Baltic Trailer Service”, tālr. 27755501
