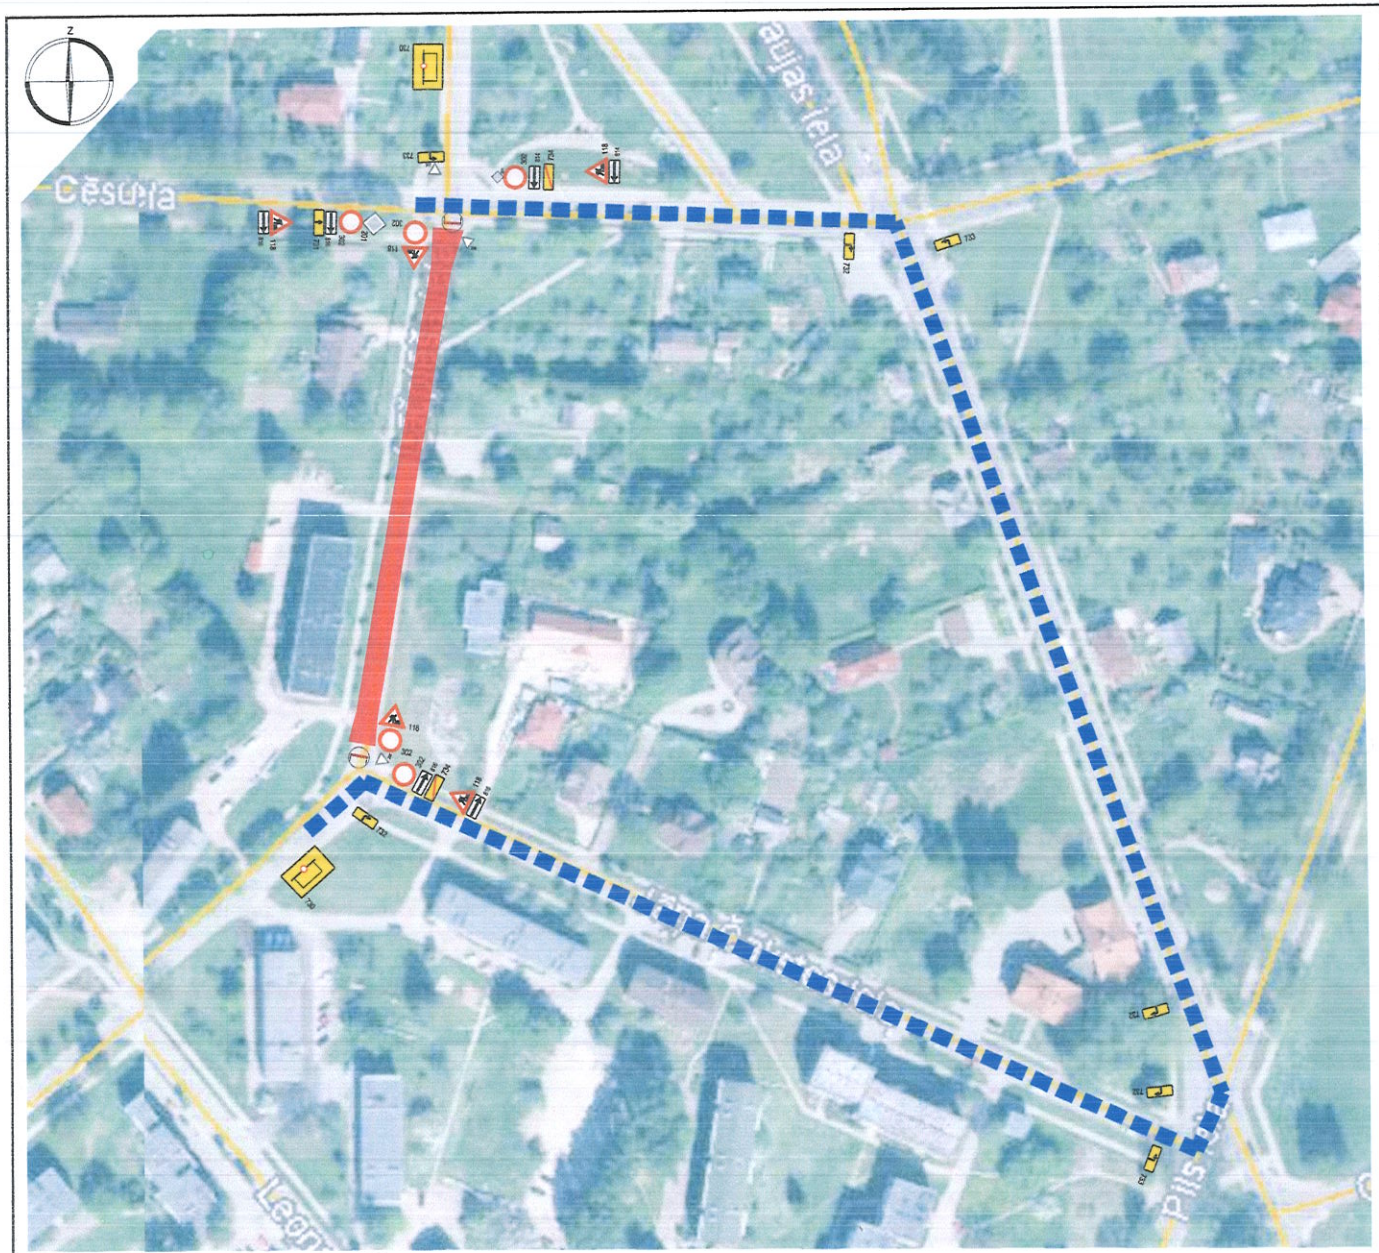

130. PLAKĀTUS UZSTĀDĪT AR IELU NOSAUKUMIEM.

SASKAŅOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS L... VALSTS CEĻI
Rīgas ... ceļu būvinženieris
V.REMESOVS 10.07.2018.

SASKAŅOTS
Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes
Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas
būvinženieris **V. Vilks**

20 18. gada 10 jūlijs.

Shēma Nr.1

Asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu laikā slēgta Lāčplēša iela no Cēsu ielas līdz Jāņa Čakstes ielai.

Apbraucamais ceļš slēgtajam posmam visiem transporta līdzekļiem organizēts pa Cēsu ielu, Raiņa ielu, Pils ielu un J.Čakstes ielu.

Gājēju kustība tiks nodrošināta gar ceļa darbu zonu pa esošajām ietvēm.

APZĪMĒJUMI

- 118 pu ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr
- e ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr
- darbu vieta
- s posma apbraucamie ceļi
- ta Nr.912, uzstādīt pirms satiksmei s posma
- Šķērsnorobežojums: vienpusīgie vadstatņi; maksimāli 2 m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (1:2) pret brauktuves malu vai barjera. Vienpusīga signālugunis uz katra vadstatņa
- Garennorobežojums: divpusīgie vadstatņi Nr 908 / 909; maksimāli 10 m attālumā cits no cita. Divpusīga signāluguns uz katra otrā vadstatņa

PIEZĪMES

1. Ceļa darbu vietas aprīkojumu uzstādīt atbilstoši MK noteikumi Nr.421 "Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Darbus veic SIA "GP holding", atbildīgais par darbu vietas aprīkojumu - Edmunds Paiders, tālr.26600554.
3. Shēmas darbības laiks - no 10.07.2018. līdz 20.07.2018.
4. Nodrošināt piekļūšanu objektiem slēgtā posma zonā. Pirms darbu uzsākšanas informēt objektu īpašniekus par ielas posma slēgšanas grafiku un braukšanas apgrūtinājumiem.
5. Mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošināt aprīkojuma atbilstošu izvietojumu. Norobežojuma barjeras Nr.912 uzstādīt pirms satiksmei slēgtajiem ceļa darbu posmiem. Lietot vadstatņus (Nr.908, 909) vai barjeras (Nr.910, 911) darbu vietas norobežošanai no brauktuves. Izmantot paligbarjeras vai signāllentes gājēju norobežošanai no darbu zonas.
6. Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēmā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK Nr. 421 punkts 20).

Saava-LV SIA "Saava-LV", Alises iela 2 ^{4}, Rīga LV 1046 Vien.reģ.Nr 40103129768, PVN Nr LV 40103129768 Tālr.: 67312227, 67611303 Fakss: 67311550 BIOA.reģ.apl.Nr 3620-R			Projektētājs: SIA "GP Holding", Vaidavas iela 8, Saulkrasti, LV-2160		
			Objekts: Asfaltbetona seguma atjaunošana Lāčplēša ielas posmā Siguldas pilsētā	Stadija: BP	Marka: SOP	Lapas Nr: 1
Sastādīja	Argils Soloveiko	10.07.2018.	Ceļa darbu vietas aprīkojuma uzstādīšanas shēma	Mērogs: bez mēroga	
tālr.29413632	argils@inbox.lv				
LBS būvpr.sert.	Nr.3-01342; 4-02739				
